جدول lom دیوار جدا کننده سالن دیتا سنتر اصفهان

ردیف	شرح کالا	مقدار	توضیحات
۱	پروفیل ۴*۸	شاخه ۱۷	کیلو گرم۶۰۰
۲	شیشه سکوریت ۶ میل با ابعاد ۰.۹۴*۲.۶۵	عدد ۱۵	دارای ۸ سوراخ نگهدارنده
۳	فنس آهنی (توری مشبک ۱۰*۱۰/ ۱۵*۱۵)	عدد ۱۵	با ابعاد ۰.۹۲*۲.۶۲
۴	لولا آهنی نمره ۱۲	عدد ۶	
۵	رنگ کاری با رنگ روغنی	مترمربع ۶۰	
۶	صفحه آهنی۰.۲۵*۰.۲۵	عدد ۱۶	کیلو گرم ۳۰

توضیحات ساخت دیوار جداکننده سالن: دیوار جدا کننده بایستی کلا از پروفیل ۴*۸ طوری ساخته شود که قابلیت جدا شدن در هر زمان را دارا باشد که درصورت تغییر مکان نصب، به راحتی عملیات جابجایی در داخل سالن دیتا سنتر صورت پذیرد. تمامی پایه های دیده شده در طرح بایستی طوری ساخته شوند که از کف و سقف با صفحه بصورت کامل چفت گردند، پایه های پروفیلی عمودی قابلیت تنظیم با پیچ را دارا باشند که در صورت جابجایی نیاز به برش کاری نداشته باشند. در استراکچر دیده شده پروفیل های افقی نیز با پیچ ومهره به هم دوخته و محکم می شوند. فنس تهیه شده قابلیت جدا سازی و نصب مجدد داشته باشند. همچنین شیشه سکوریت ها نیز با ۸ پایه و پیچ مخصوص شیشه سکوریت به استراکچر نصب می گردند. ضمنا استراکچر بایستی به دو درب باز شو مجهز گرددکه قابلیت نصب قفل را داشته باشد. ضمنا رنگ آمیز کامل استراکچر با رنگ روغنی سفید صورت پذیرد.



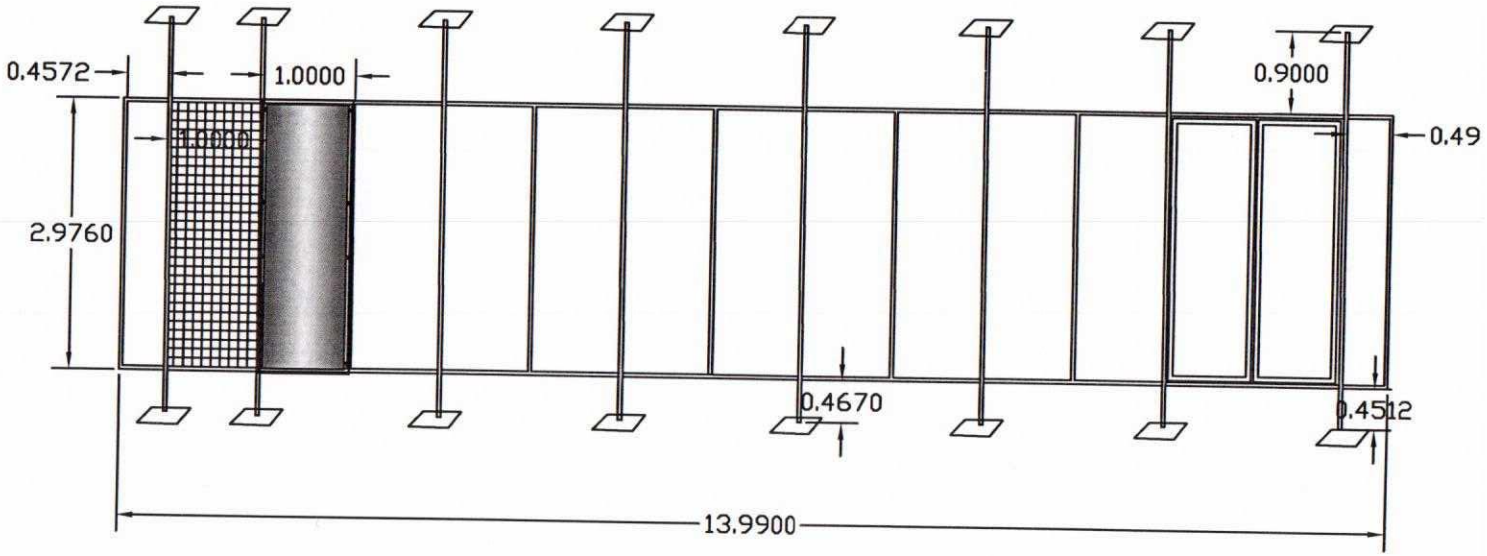
0.4572
1.0000
0.9000
0.49
2.9760
0.4670
0.4512
13.9900
